


СТРОИТЕЛЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН – ГРАФИК

ВИДОВЕ РАБОТИ	Тр	Р	Дни	РАБОТНИ ДНИ																
				10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
		/чгн/	/бр/																	
1. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ	30	3	10	3																
2. ИЗКОПНИ РАБОТИ	50	5	10		5															
3. ГРУБ СТРОЕЖ ПОЛАГАНЕ НА НАСТИЛКИ	150	5	30			5														
4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТАЛАЦИИ	80	4	20						4											
5. ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ	30	3	10							3										
6. ОКОЛНО ПРОСТРАНСТВО	40	4	10								4									

Σ Тр = 380

$$\frac{Об. \text{ мр.}}{\Delta_{\text{max}}} = \frac{380}{90} = 4$$
$$\frac{Р \text{ ср.}}{Р_{\text{max}}} = \frac{4}{5} = 0.8$$
$$\frac{\Delta \text{ ср.}}{\Delta_{\text{max}}} = \frac{40}{90} = 0.444$$

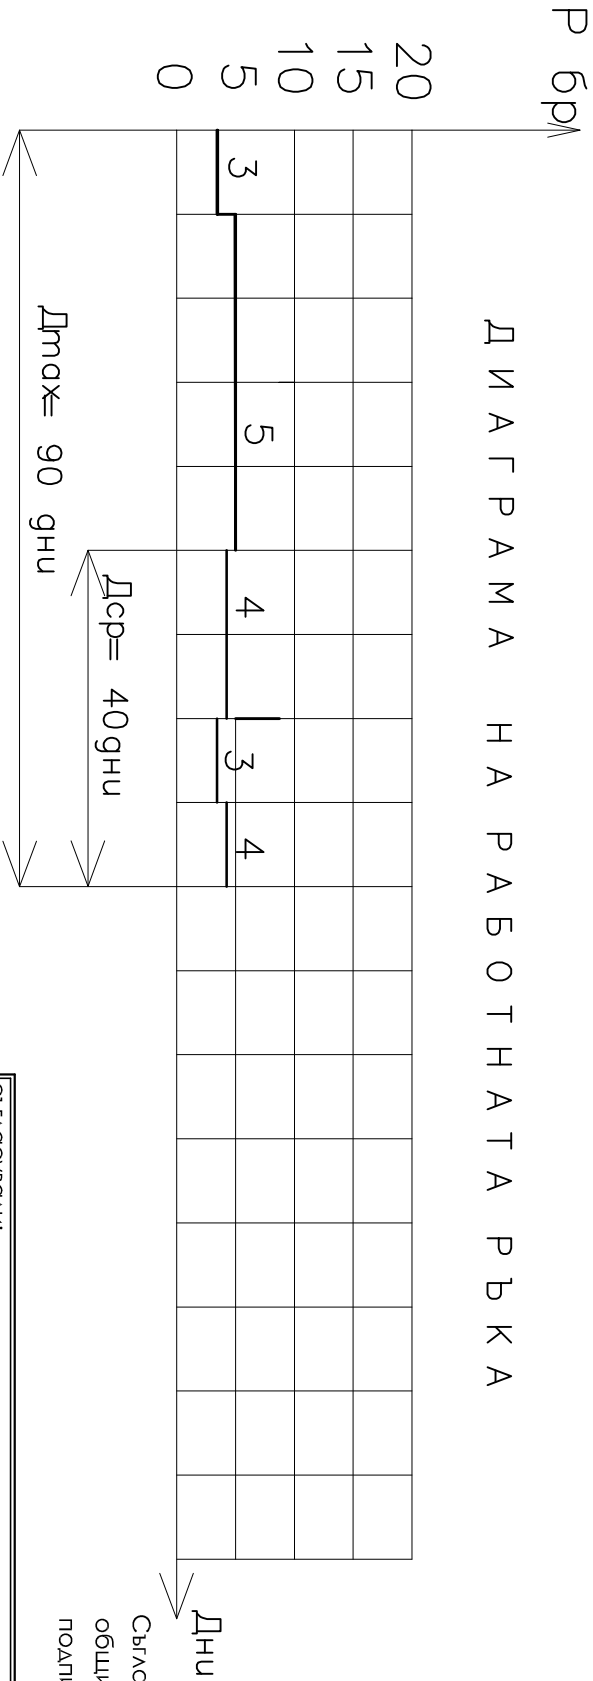

Съгласувал Инвеститор:
община Димитровград
подпис:.....

СЪГЛАСУВАЛИ:		ПОДПИС
Архитектура	арх. Мирослав Гюневлев	
Ел	инж. Анна Димова	
Вик	инж. Емилиа Химова	
ОВК	инж. Костадинка Атанасова	
ВП	инж. Стефан Стефанов	
Технология	инж. Габриела Симеонова	

ВЛАДИМИРОВ ■ ГЮНЕВЛЕВ архитекти			
обект:	Престройка и преустройство на съществуваща двуетажна масивна сграда в УПИ III-491 за здравни нужди, кв. 57, кв. Чернокоиево, гр. Димитровград.		
	Община Димитровград		
възложител:	Община Димитровград		
съвръжание:	СТРОИТЕЛЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ГРАФИК		
проектант:	М 1:250		
у-а фирма:	инж. Божин Зайков		ЧОСТ: ЛБЗ
датс:	арх. Мирослав Гюневлев		фаза: РП
	октомври 2011 г.		лист 5/5
